



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 22 September 2020

Nomor : 002/ RSMU/HTA/IX/2020
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Laporan Hasil Kunjungan Radiologi RS Delta Surya Sidoarjo

Yth. dr. Ria Sylvia Husementini, Sp.M
Plt. Direktur RS Mata Undaan
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan kunjungan penggunaan alat X-Ray untuk pelayanan radiologi di RS Delta Surya Sidoarjo, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Kunjungan kegiatan tersebut, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Tim HTA


dr. Dewi Rosarina, Sp.M

Laporan hasil kunjungan Radiologi Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo

Waktu kunjungan : Sabtu, 19 September 2020
Jam kunjungan : 09:00 – 11:00 WIB
Peserta : dr. Valeri Al Hakiim, Sp.M
Meliana Handayani
Akhmad DzulFigri, S. Tr. TEM
Muhammad Rofiq, A. Md., Kep.
Wahyudi Budiman, A.Md., Rad (RS Haji Surabaya)

1. Peserta tiba di lokasi (RS Delta Surya Sidoarjo) didampingi oleh Pak Yudi (RS Haji Surabaya) dan Vendor PT. Mulya Husada Jaya
2. Peserta diberikan penjelasan terkait alat X-Ray oleh vendor
3. Peserta diberikan penjelasan terkait alat yang digunakan oleh Radiografer RS Delta Surya Sidoarjo (Pak Nanang)
4. Penjelasan alat, diskusi dan tanya jawab.
5. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam instalasi alat X-Ray yaitu:
 - a. Vendor memiliki pengalaman dalam pembuatan ruangan radiologi
 - b. Kontraktor khusus ruangan radiologi (Rekomendasi kontraktor yaitu Pak Sudi telah memiliki pengalaman dalam membuat ruangan radiologi)
 - c. Lapisan Pb (timbangan)
 - d. Luas ruangan
 - e. Jarak ke kamar mandi dan ruang ganti
 - f. Jarak ke ruang monitor / console
 - g. Jarak ke ruang CR dan printer
 - h. Kekuatan lantai karena akan dilakukan pengeboran untuk instalasi 3 rangkaian alat X-Ray (Table pasien, Tube Stand dan Bucky stand)
 - i. Kelistrikan dan instalasi kabel
 - j. Letak AC tidak berada di area sekitar alat
 - k. Suhu ruangan (20 – 22 derajat Celsius)
 - l. Kelembapan ruangan
6. Saat ini RS Delta Surya belum memiliki masalah terkait alat X-ray yang digunakan / DRGEM (Penggunaan sejak November 2019)
7. Pengiriman alat kurang lebih 2 bulan dan instalasi sekitar 1 minggu
8. Diskusi dan saran dalam proses pengadaan pelayanan radiologi dengan alur sebagai berikut:
 - a. Tentukan vendor mana yang akan diajak bekerja sama dalam pembelian alat
 - b. Minta vendor untuk membantu dalam proses pembuatan ruangan radiologi yang meliputi teknis dan konstruksi bangunan sesuai dengan standar
 - c. Pastikan apakah RSMU memiliki kontraktur sendiri, jika tidak ada maka ada rekomendasi kontraktor yang mengetahui dan memiliki pengalaman (Pak Sudi)
 - d. Pihak vendor dan kontraktor selanjutnya akan bekerjasama dalam pembangunan dan penataan ruangan sesuai dengan standar
 - e. Pihak RSMU melakukan perekrutan tenaga PPR untuk pengurusan ijin BAPETEN karena untuk mendapatkan ijin BAPETEN tersebut dibutuhkan id PPR yang bersangkutan.
 - f. Melengkapi seluruh data-data yang dibutuhkan dalam pengurusan ijin BAPETEN
 - g. Lakukan uji fungsi, uji kesesuaian dan uji paparan
 - h. Buatlah jadwal yang detail mulai dari penetapan vendor, pembuatan ruangan hingga operasional

9. Lampiran gambar
a. Xray



- b. Patient table





RS MATA
UNDAAN


c. Tube stand



Bucky stand



d. Ruang console

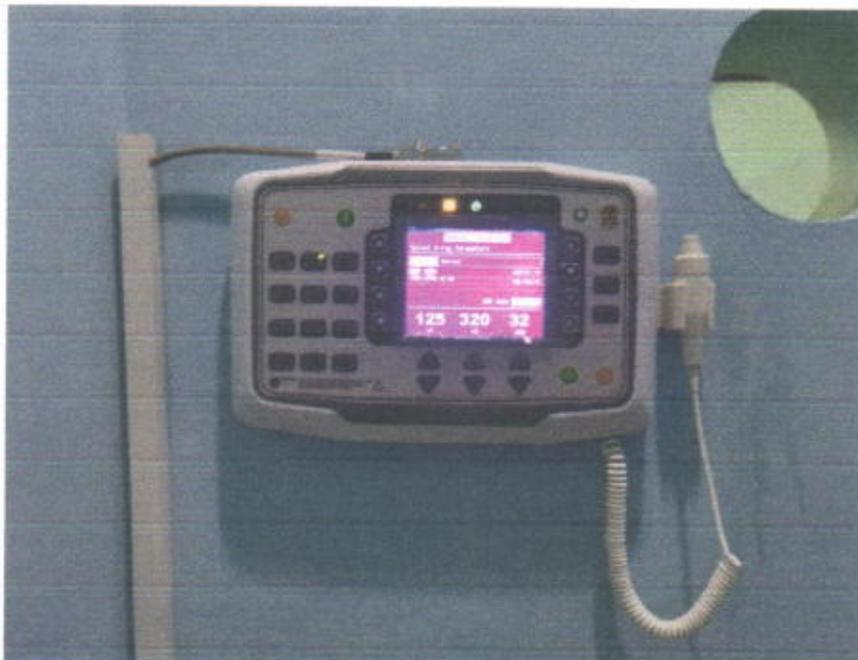

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia


T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)
remataundaan.co.id

e. Generator


TLD

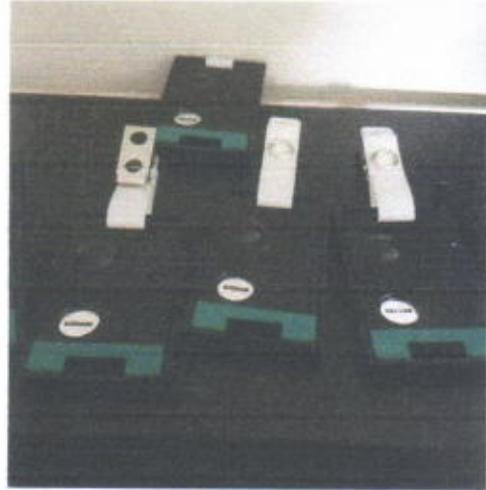

f. Film viewer



g. CR



Hormat Kami,
Ketua Tim HTA


dr. Dewi Rosarina, Sp.M
