

Sudah Terima Dari : RS MATA UNDAAN
Recived From

Banyaknya : Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Amount

Untuk Pembayaran : Pelunasan pembayaran 25% pekerjaan perbaikan system hydrant springker (Gedung medik sentral)
For Payment

Rp. 58,225,500

Pembayaran dengan Chegue / Bilyet Giro / Transfer

Nama : ANDRI SETIAWAN AFRISAL
Nomor rekening : 2140790535
Bank : BCA

surabaya, 16 Agustus 2022



ANDRI SETIAWAN AFRISAL

Kwitansi ini dianggap sah, apabila pembayaran dengan Bilyet Giro / Chengue tsb dapat diuangkan

This receipt will be cleared after Bilyet Giro / Chegue can cleared

8.24/22
3

Sudah Terima Dari : RS MATA UNDAAN
Recived From

Banyaknya : Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Amount

Untuk Pembayaran : Pelunasan pembayaran pekerjaan tambahan perbaikan system hydrant splinker (Gedung medik sentral)
For Payment

Rp. 4,739,625

Pembayaran dengan Chegue / Bilyet Giro / Transfer

Nama : ANDRI SETIAWAN AFRISAL
Nomor rekening : 2140790535
Bank : BCA

surabaya, 16 Agustus 2022



ANDRI SETIAWAN AFRISAL

Kwitansi ini dianggap sah, apabila pembayaran dengan Bilyet Giro / Chengue tsb dapat diuangkan
This receipt will be cleared after Bilyet Giro / Chegue can cleared

g. 21/22

**BERITA ACARA
NOMOR :017/RSMU/IPSRS/IX/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh , bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua,kami masing-masing:

1. **SUDARTO, Manager PSP RS**, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Dan

2. **ANDRI SETIAWAN AFRISAL, Kontraktor**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

telah melakukan pengecekan hasil pekerjaan perbaikan dan penggantian Instrumen System Hydrant dengan hasil sebagai berikut:

1. Pekerjaan telah dikerjakan sesuai spesifikasi dan memenuhi standar parameter
2. Telah dilakukan perbaikan dan penggantian instrument dengan rincian terlampir
3. Telah dilakukan uji fungsi, tes comm dan simulasi setelah dilakukan perbaikan dan system hydrant RSMU berfungsi dengan baik dan memenuhi parameter sesuai ketentuan (PMK), yaitu:

1. Stand by pada tekanan 10 bar
2. Jockey pump bekerja pada 8 bar, Main pump 6 bar, Diesel pada 5 bar kondisi listrik padam
3. Tekanan semburan titik tertinggi 4.5 bar, titik terjauh 6.7 bar dengan 3 bukaan selang selama +/- 2 menit

4. Garansi pemeliharaan selam 1 (satu) tahun sejak Berita Acara ini di tandatangani

5. Biaya pelunasan pekerjaan utama 25% sebesar Rp. 58.225.500,-

Biaya pelunasan pekerjaan tambah 10% sebesar Rp. 4.739.625,-

Total **Rp. 62.965.125,-**

akan ditransfer ke

- **Bank BCA No Rek.2140790535 a/n ANDRI SETIAWAN AFRISAL**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 20 September 2022

Pihak Kedua
Kontraktor



ANDRI SETIAWAN AFRISAL


Pihak Kesatu
Plt. Ka IPSRS



SUDARTO



RS MATA
UNDAAN

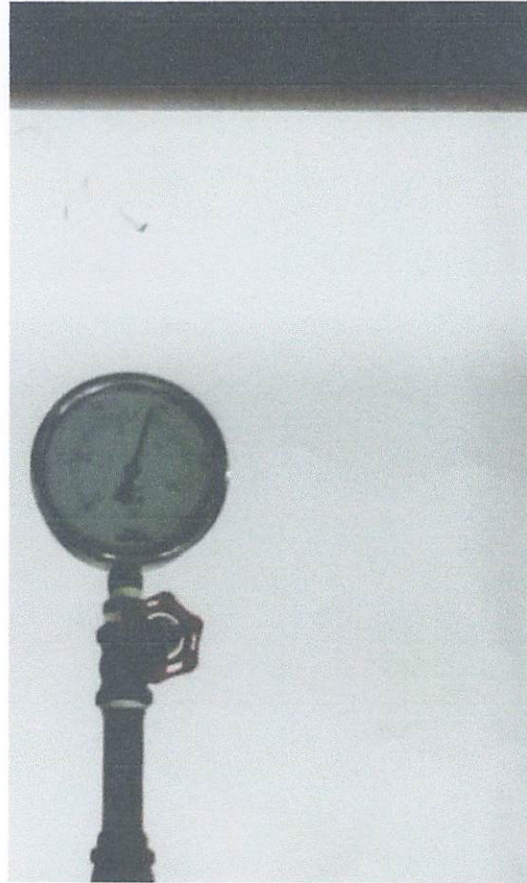

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

LIST UNIT YANG DIGANTI DAN DITAMBAH

| No. | Nama Unit | Satuan |
|-----|--|--------|
| 1 | Panel Pumpa Hydrant Splingker | 1 Unit |
| 2 | Safety Valve 4" Clas 16K | 1 Unit |
| 3 | Safety Valve 1" Clas 16K | 1 Unit |
| 4 | Presersuit 15 Bar Clas 16K | 3 Unit |
| 5 | Paking Preser Tank | 1 Unit |
| 6 | Wering Panel Diesel Pump | 1 Unit |
| 7 | Get Valve Toyo 1" | 4 Unit |
| 8 | Flow Sweat 2½" | 1 Unit |
| 9 | Oli Pumpa Disel Pump | 10 Ltr |
| 10 | Air Papiater Pumpa Disel Pump | 15 Ltr |
| 11 | Preser Geat 15kg | 3 Unit |
| 12 | Get Valve ½" 16K | 3 Unit |
| 13 | Batrai Cas Aki 25Volt | 1 Unit |
| 14 | Grounding Panel Hydrant Splingker 10 Meter | 10 Mtr |
| 15 | Paking Set Hydrant Pilar 10K | 3 Unit |
| 16 | Mekanik Seal Pumpa Elektrik Pump | 1 Unit |
| 17 | Sensor/Modul Flow Sweat 2½" | 4 Unit |
